# Plano de Projeto

**Cliente: UTFPR** 

Projeto: Alteração JabRef

Versão 1.0

# Histórico de Alterações

Data	Versão	Descrição	Responsável
13/06/2018	1.0	Criação do documento	Diego
21/06/2018	1.1	Alterações no escopo	Carlos
29/06/2018	1.2	Inclusão gráfico de Gantt	Carlos
29/06/2018	1.3	Controle de mudanças, Plano de testes	Diego

Plano de Projeto Página 2 de 9

### Conteúdo

- 1 DESCRIÇÃO DO PROJETO
- 2 PLANO AMBIENTE
- 3 ESCOPO
  - 3.1 REQUISITOS
  - 3.2 ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP)
  - 3.3 MATRIZ DE RASTREABILIDADE DAS TAREFAS
- 4 CRONOGRAMA
  - 4.1 ESTIMATIVAS
  - 4.2 GRÁFICO DE GANTT
- 5 CONTROLE DE MUDANÇA
- 6 PLANO DE COMUNICAÇÃO
- 7 PLANO DE TESTE
- 8 PLANO DE ACEITAÇÃO

# 1 Descrição do projeto

O jabref é um gerenciador de referências muito utilizado por pesquisadores. Atualmente não há uma maneira de pesquisar artigos, dificultando a busca dos mesmo, o que obriga o usuário a vasculhar todo o ficheiro para encontrar o que se deseja.

Com a implementação de uma ferramenta de busca em um ficheiro de arquivos, torna-se muito mais rápido e fácil encontrar o arquivo desejado além de organizá-los por relevância conforme a quantidade de citações do artigo.

## 2 Plano ambiente

Essa seção define o Plano de Ambiente para o projeto, com o objetivo de descrever os recursos de hardware software disponíveis e detalhar os diferentes ambientes do projeto.

Todos os arquivos novos ou alterados deverão ser submetidos a ferramenta de controle de versão para serem analisadas e aceitas. Os teste unitários serão realizados com o Junit.

1. Software: JAVA 8

Hardware: Intel Core I7 4 Gb
Sistema Operacional: Windows 10

4. Git

- 5. Junit
- 6. GitHub

# 3 Escopo


3.1 Requisitos:

Plano de Projeto Página 3 de 9

- Implementar a busca de arquivo .PDF (e, opcionalmente, .PS, .ODT, .DOCX, .DOC, .PPT, .PPTX, .ODP) conforme o título do item de bibliografia em consulta.
- Mostrar a quantidade de citações do documento.
- Mostrar o fator de impacto do local em que o documento foi publicado.

# 3.2 Estrutura Analítica de Projeto (EAP):

Plano de Projeto Página 4 de 9

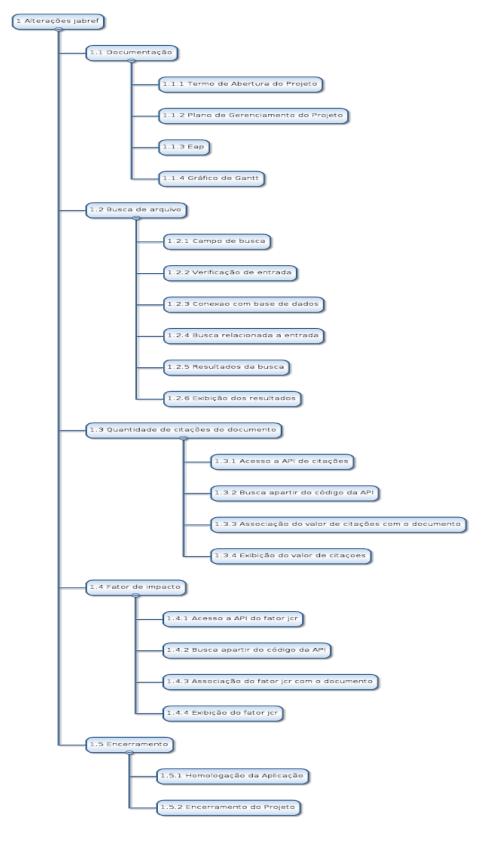

www.wbstool.com

#### 3.3 Matriz de rastreabilidade das tarefas:

Plano de Projeto Página 5 de 9

ID	DESCRIÇÃO	DEPENDÊNCIA	PACOTE		
1.1.1	Criação do termo de abertura.	-	Documentação		
1.1.2	Criação do plano de gerenciamento de projeto.	1.1.1	Documentação		
1.1.3	Criação da EAP.	1.1.2	Documentação		
1.1.4	Criação do gráfico de Gantt.	1.1.3	Documentação		
1.2.1	Permitir com que o usuário entre com o nome do arquivo a ser pesquisado.	•	Busca		
1.2.2	Verificar a entrada dos dados.	1.2.1	Busca		
1.2.3	Acessar a base de arquivos.	1	Busca		
1.2.4	Buscar arquivos correspondentes à entrada de dados do usuário.	1.2.1 1.2.2 1.2.3	Busca		
1.2.5	Prover uma maneira para que o usuário veja a resultado da pesquisa.		Busca		
1.2.6	Listar os resultados encontrados.	1.2.5	Busca		
1.3.1	Definir API para buscar a quantidade de citações.	-	Quantidade de citações do documento		
1.3.2	Usar o código de referência para realizar a busca.	1.2.4 1.3.1	Quantidade de citações do documento		
1.3.3	Associar o valor encontrado com o documento buscado.	1.3.2	Quantidade de citações do documento		
1.3.4	Exibir a quantidade de citações para o	1.2.5 1.3.3	Quantidade de citações do		

Plano de Projeto Página 6 de 9

	usuário.		documento
1.4.1	Definir API para buscar o fator (jcr).	-	Fator de impacto
1.4.2	Usar o código de referência para realizar a busca nessa API.	1.2.4 1.4.1	Fator de impacto
1.4.3	Associar esse valor com o respectivo resultado obtido pela busca.	1.4.2	Fator de impacto
1.4.4	Exibir o fator ao usuário	1.2.5 1.4.3	Fator de impacto
1.5.1	Homologar a Aplicação.	1.2.6 1.3.4 1.4.4	Encerramento
1.5.2	Encerrar Projeto.	1.5.1	Encerramento

# 4 Cronograma

## 4.1 Estimativas

O tempo das tarefas foram estimadas segundo o critério de opinião especializada, usando a regra de 3 pontos (estimativa PERT) para estimar a duração de cada tarefa.

Plano de Projeto Página 7 de 9

Tarefa	Otimista 1	Pessimista 1	Realista 1	Estimativa final em horas	Estimativa final arredondada	
1.1.1	-	-	-			
1.1.2	10.5	35	21	21.58333333	22	
1.1.3	1	4	2	2.166666667	2.5	
1.1.4	1	4	2	2.166666667	2.5	
1.2.1	1	4	2	2.166666667	2.5	
1.2.2	0.5	2	1	1.083333333	1.5	
1.2.3	1	5	2.5	2.666666667	3	
1.2.4	0.5	1	0.5	0.5833333333	1	
1.2.5	1	4	2	2.166666667	2.5	
1.2.6	0.5	2	1	1.083333333	1.5	
1.3.1	2	8	3.5	4	4	
1.3.2	0.5	1	0.5	0.5833333333	1	
1.3.3	0.5	1.5	1	1	1	
1.3.4	0.5	3	1	1.25	1.5	
1.4.1	2	8	3.5	4	4	
1.4.2	0.5	1	0.5	0.5833333333	1	
1.4.3	0.5	1.5	1	1	1	
1.4.4	0.5	3	1	1.25	1.5	
1.5.1	30	60	45	45	45	
1.5.2	2	8	4	4.333333333	4.5	
				Tempo Total:	103.5	

## 4.2 Gráfico de Gantt:

Com as tarefas estimadas e suas dependências definidas, elas foram sequenciadas com a utilização de um gráfico de Gantt.

Tarefa	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6	DIA 7	DIA 8	DIA 9	<b>DIA 10</b>	<b>DIA 11</b>	<b>DIA 12</b>	<b>DIA 13</b>	DIA 14
1.1.1														
1.1.2														
1.1.3														
1.1.4														
1.2.1														
1.2.2														
1.2.3														
1.2.4														
1.2.5														
1.2.6														
1.3.1														
1.3.2														
1.3.3														
1.3.4														
1.4.1														
1.4.2														
1.4.3														
1.4.4														
1.5.1														
1.5.2														

Plano de Projeto Página 8 de 9

# 5 Controle de Mudanças

Essa seção específica todas as etapas do processo de mudanças no projeto, as mudanças devem seguir o seguinte ciclo:

- A mudança será analisada pelo gerente de projetos que analisa o risco e impacto no projeto juntamente com a equipe.
- A decisão deve ser comunicada através de uma reunião. A comunicação deve ser realizada com muito cautela sempre justificando os pontos considerados na tomada da decisão.

# 6 Plano de Comunicação

Todas as informações geradas pelo projeto devem ser limitadas apenas a equipe do projeto sem nenhuma restrição. Diariamente, toda equipe deve se reportar ao gerente de projetos informando todo o trabalho realizado . Isso deve ser realizado no final de cada dia, após isso o gerente de projetos deve elaborar um Relatório que deve ser comunicado a toda a equipe do projeto.

#### 7 Plano de Testes

Esta seção define o planejamento de testes, os testes serão todos automatizados utilizando o Junit, ao final de cada tarefa será executado o script de testes da aplicação, as tarefas só terão o status de concluída e aprovada quando todos os testes automatizados para ela passarem. Detalhes sobre defeitos deverão ser registrados como uma issue na ferramenta github.

Nome	Responsabilidades			
Diego Henrique de Abreu	Planejamento, Coordenação e Execução dos testes			

# 8 Plano de Aceitação

Essa seção define o Plano de Aceitação para o projeto, com o objetivo de registrar como será realizado o processo de aceitação da solução.

O projeto será concluído com sucesso caso os seguintes critérios estejam satisfeitos:

- Software contemplando os requisitos exigidos
- O software desenvolvido deve satisfazer os critérios estabelecidos no plano de qualidade
- Aprovação do software desenvolvido no ambiente de testes pelo cliente.

Plano de Projeto Página 9 de 9
